
Klimatilpasning Grønne Veje i GF Holmehus

Præsentation på Infomøde d. 10-11-2026

Projektleder - Oliver Wessel

HOFOR

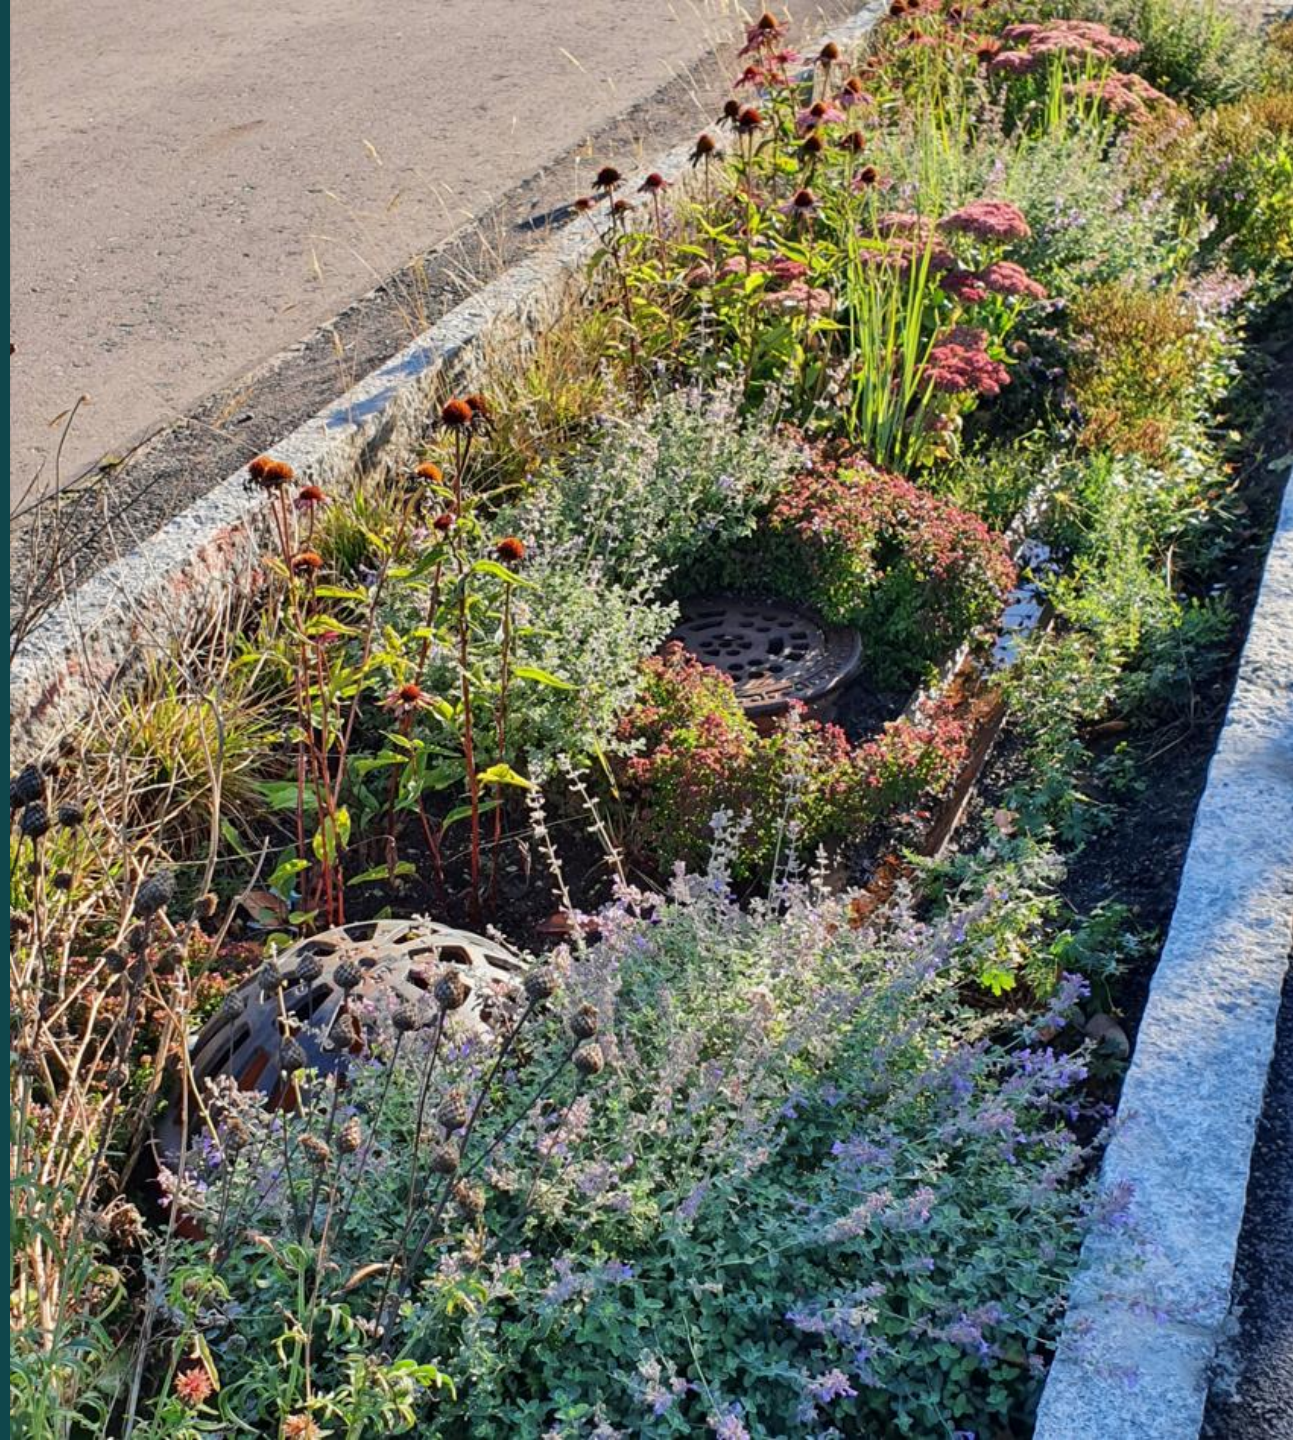

Agenda

Tidsplan


Projektplan

Lukning af veje

Støj-, lugt- og luftsgener

Kommunikationsplan

Spørgsmål?

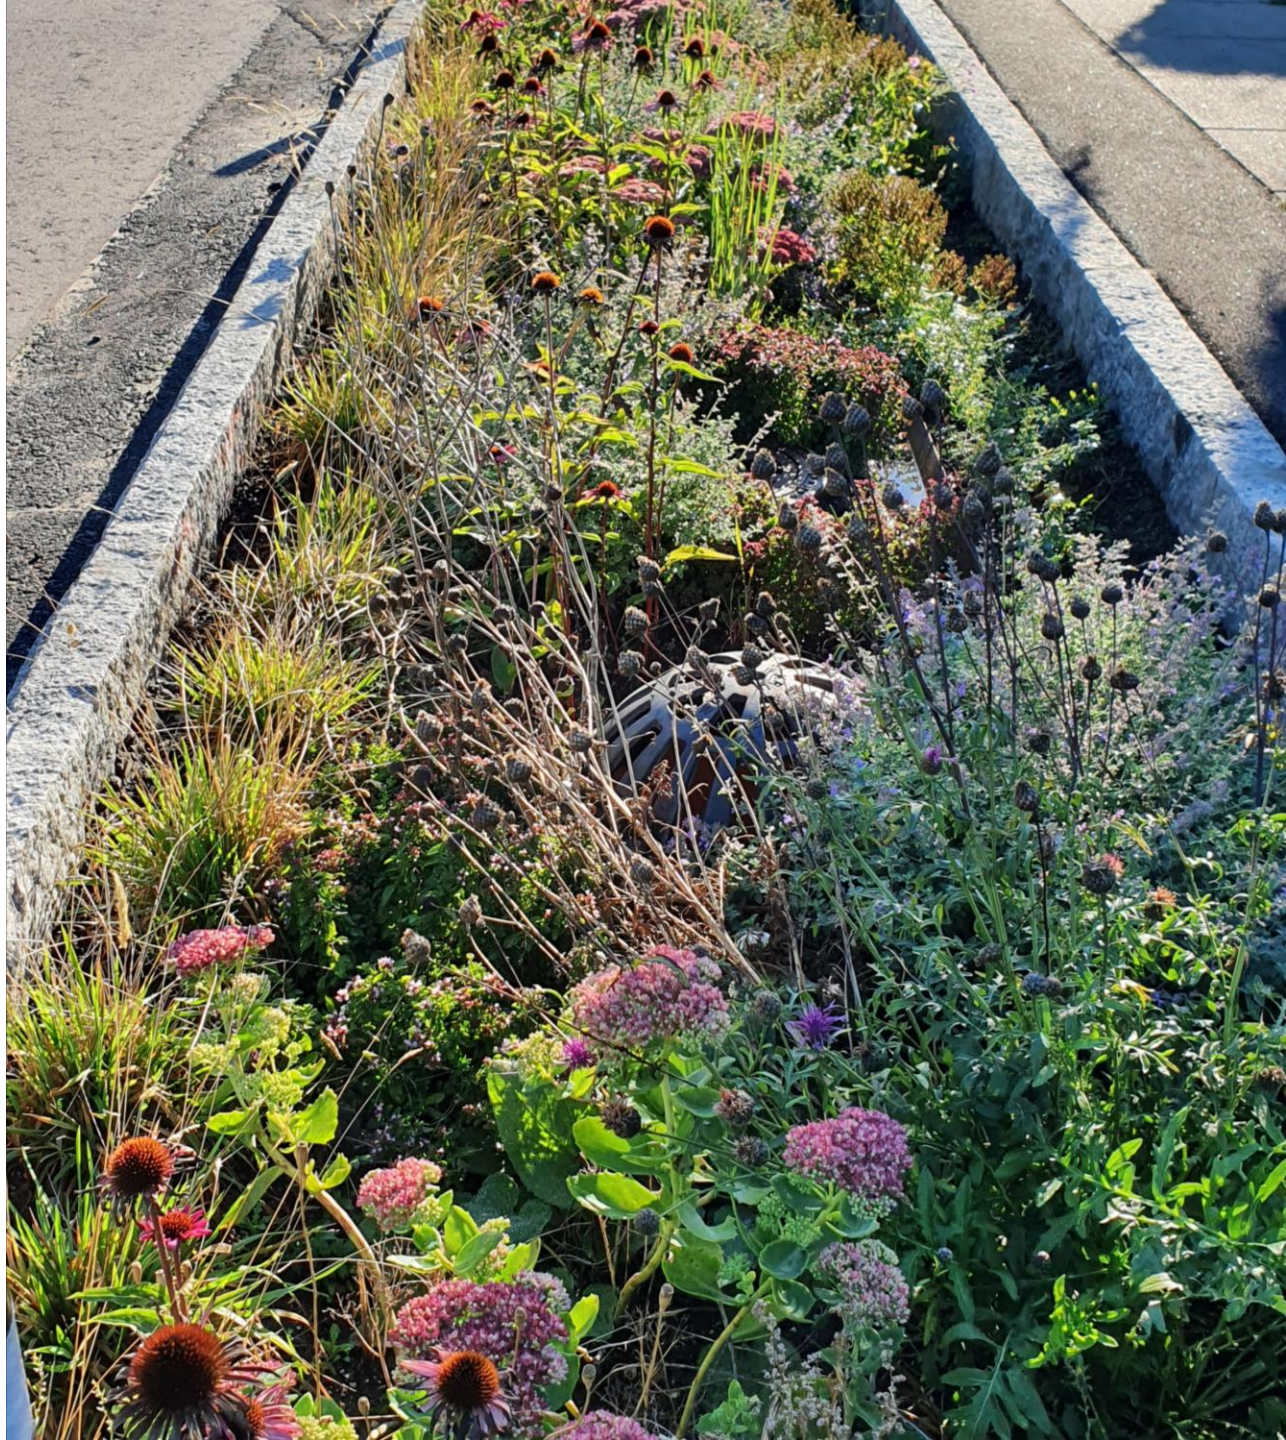


HOFOR

Tidsplan lige nu –
fremsendes efterfølgende

- Skurvogn sættes op d. 10-12-2026 – 18-12-2026
- Første bed opstartes d. 04-01-2027
- Det grønne areal er færdigetableret d. 25-02-2028
- Projektåbning med pølsevogn og fejring af projektet d. xx-03-2028




LAR bede GF Holmevænge	186 dage	ma 26-10-26	fr 03-09-27
Kontraktindgåelse	1 dag	ma 26-10-26	ma 26-10-26
Projektgennemgang og sikkerhedskoordinering	1 dag	on 04-11-26	on 04-11-26
Vejsyn	1 dag	fr 27-11-26	fr 27-11-26
Søgning af LER og gravetilladelse	7 dage	ma 30-11-26	ti 08-12-26
Varsling af beboer - Byggeplads	1 dag	on 09-12-26	on 09-12-26
Etablering af byggeplads	7 dage	to 10-12-26	fr 18-12-26
Etape 1 - Gravehold 1	49 dage	fr 18-12-26	fr 05-03-27
Varsling af be-boer - Prøvebed	1 dag	fr 18-12-26	fr 18-12-26
Prøvebed - Stenløsevej (ST10)	15 dage	ma 04-01-27	fr 22-01-27
Stenløsevej - 2 bede	35 dage	ma 18-01-27	fr 05-03-27
Varsling af beboer - Etape 1	1 dag	ma 18-01-27	ma 18-01-27
Bed nr. ST12	13 dage	ma 25-01-27	on 10-02-27
Bed nr. ST18	13 dage	to 11-02-27	ma 01-03-27
Asfalt, Filterjord og evt. mangler - Etape 1 og Prøvebed	4 dage	ti 02-03-27	fr 05-03-27
Etape 2 - Gravehold 1	69 dage	ma 01-03-27	fr 11-06-27
Merløsevej - 5 bede	69 dage	ma 01-03-27	fr 11-06-27
Varsling af beboer - Etape 2	1 dag	ma 01-03-27	ma 01-03-27
Bed nr. ME45	13 dage	ma 08-03-27	on 24-03-27
Bed nr. ME47	11 dage	ti 30-03-27	ti 13-04-27
Bed nr. ME49	11 dage	on 14-04-27	on 28-04-27
Bed nr. ME51	13 dage	to 29-04-27	fr 28-05-27
Bed nr. ME59	11 dage	fr 21-05-27	fr 04-06-27
Asfalt, Filterjord og evt. mangler - Etape 2	5 dage	ma 07-06-27	fr 11-06-27
Etape 3 - Gravehold 1	35 dage	ma 07-06-27	fr 23-07-27
Stenløsevej - 2 bede	35 dage	ma 07-06-27	fr 23-07-27
Varsling af beboer - Etape 3	1 dag	ma 07-06-27	ma 07-06-27
Bed nr. ST39	13 dage	ma 14-06-27	on 30-06-27
Bed nr. ST20	15 dage	to 01-07-27	ma 19-07-27
Asfalt, Filterjord og evt. mangler - Etape 3	4 dage	ti 20-07-27	fr 23-07-27
Etape 4 - Gravehold 1	46 dage	ma 19-07-27	ma 20-09-27
Stenløsevej - 2 bede	46 dage	ma 19-07-27	ma 20-09-27
Varsling af beboer - Etape 4	1 dag	ma 19-07-27	ma 19-07-27
Bed nr. ST37	13 dage	ma 26-07-27	ma 09-08-27
Bed nr. ST34	13 dage	ti 10-08-27	to 26-08-27
Bed nr. ST26	13 dage	fr 27-08-27	ti 14-09-27
Asfalt, Filterjord og evt. mangler - Etape 4	4 dage	on 15-09-27	ma 20-09-27

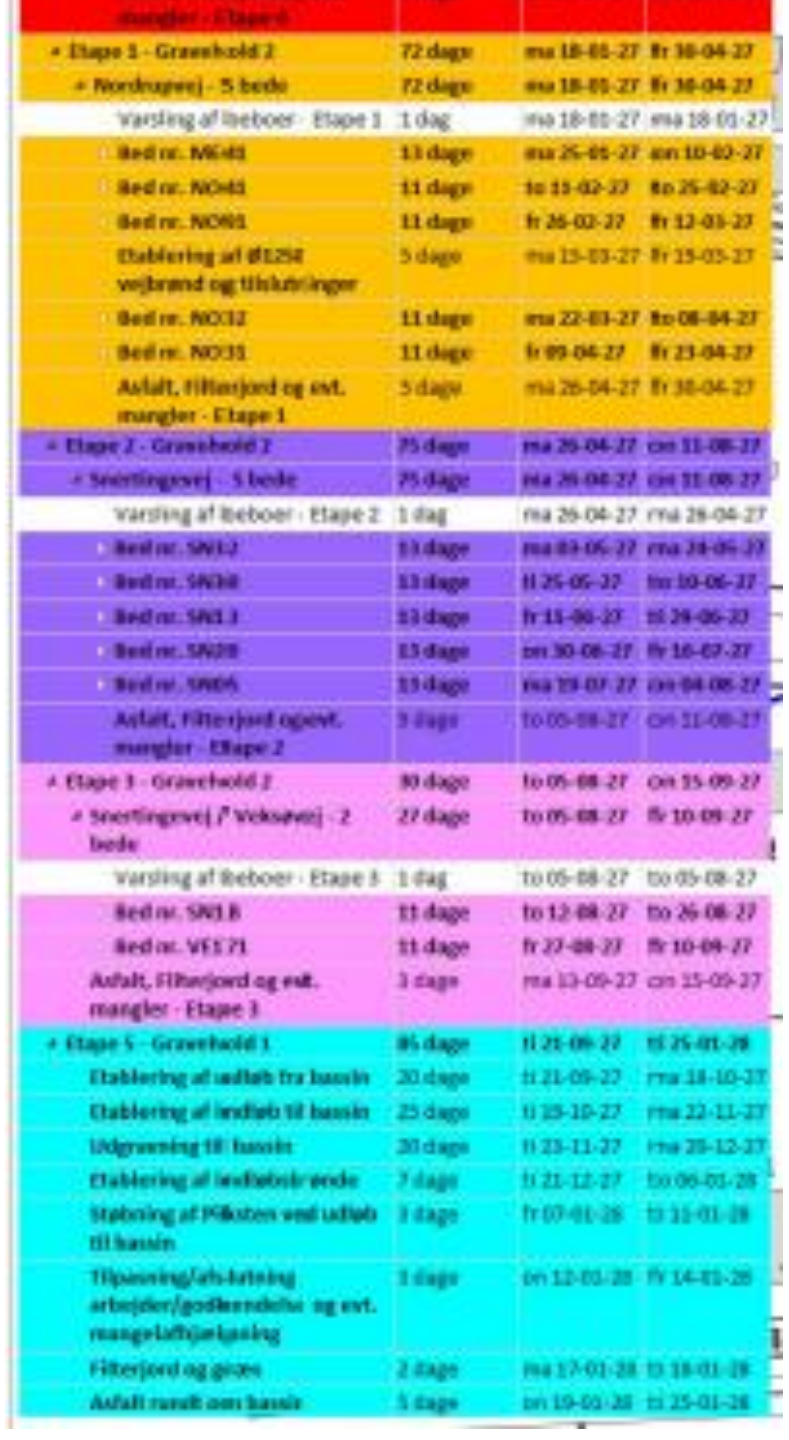

Etape 1 - Gravehold 2	72 dage	ma 18-01-27	fr 30-04-27
Nordrupvej - 5 bede	72 dage	ma 18-01-27	fr 30-04-27
Varsling af beboer - Etape 1	1 dag	ma 18-01-27	ma 18-01-27
Bed nr. ME40	13 dage	ma 25-01-27	on 10-02-27
Bed nr. NO40	11 dage	to 11-02-27	to 25-02-27
Bed nr. NO60	11 dage	fr 26-02-27	fr 12-03-27
Etablering af Ø125# vejbrønd og tilslutninger	5 dage	ma 15-03-27	fr 19-03-27
Bed nr. NO32	11 dage	ma 22-03-27	to 08-04-27
Bed nr. NO31	11 dage	fr 09-04-27	fr 23-04-27
Asfalt, Filterjord og evt. mangler - Etape 1	5 dage	ma 26-04-27	fr 30-04-27
Etape 2 - Gravehold 2	75 dage	ma 26-04-27	on 11-08-27
Snerlingevej - 5 bede	75 dage	ma 26-04-27	on 11-08-27
Varsling af beboer - Etape 2	1 dag	ma 26-04-27	ma 26-04-27
Bed nr. SN12	13 dage	ma 03-05-27	ma 24-05-27
Bed nr. SN30	13 dage	ti 25-05-27	to 10-06-27
Bed nr. SN13	13 dage	fr 11-06-27	ti 29-06-27
Bed nr. SN29	13 dage	on 30-06-27	fr 16-07-27
Bed nr. SN06	13 dage	ma 19-07-27	on 04-08-27
Asfalt, Filterjord og evt. mangler - Etape 2	3 dage	to 05-08-27	on 11-08-27
Etape 3 - Gravehold 2	80 dage	to 05-08-27	on 25-09-27
Snerlingevej / Veksøvej - 2 bede	27 dage	to 05-08-27	fr 10-09-27
Varsling af beboer - Etape 3	1 dag	to 05-08-27	to 05-08-27
Bed nr. SN18	11 dage	to 12-08-27	to 26-08-27
Bed nr. VE171	11 dage	fr 27-08-27	fr 10-09-27
Asfalt, Filterjord og evt. mangler - Etape 3	3 dage	ma 13-09-27	on 15-09-27
Etape 5 - Gravehold 1	85 dage	ti 21-09-27	ti 25-01-28
Etablering af udløb fra bassin	20 dage	ti 21-09-27	ma 18-10-27
Etablering af indløb til bassin	25 dage	ti 19-10-27	ma 22-11-27
Udgravning til bassin	20 dage	ti 23-11-27	ma 20-12-27
Etablering af nedløbsbrønde	7 dage	ti 21-12-27	to 06-01-28
Støbning af Pillesten ved udløb til bassin	3 dage	fr 07-01-28	ti 11-01-28
Tilpasning/afslutning arbejder/godkendelse og evt. mangelafhjælpning	3 dage	on 12-01-28	fr 14-01-28
Filterjord og græs	2 dage	ma 17-01-28	ti 18-01-28
Asfalt rundt om bassin	5 dage	on 19-01-28	ti 25-01-28

HOFOR

Projektplan – Fremsendes efterfølgende

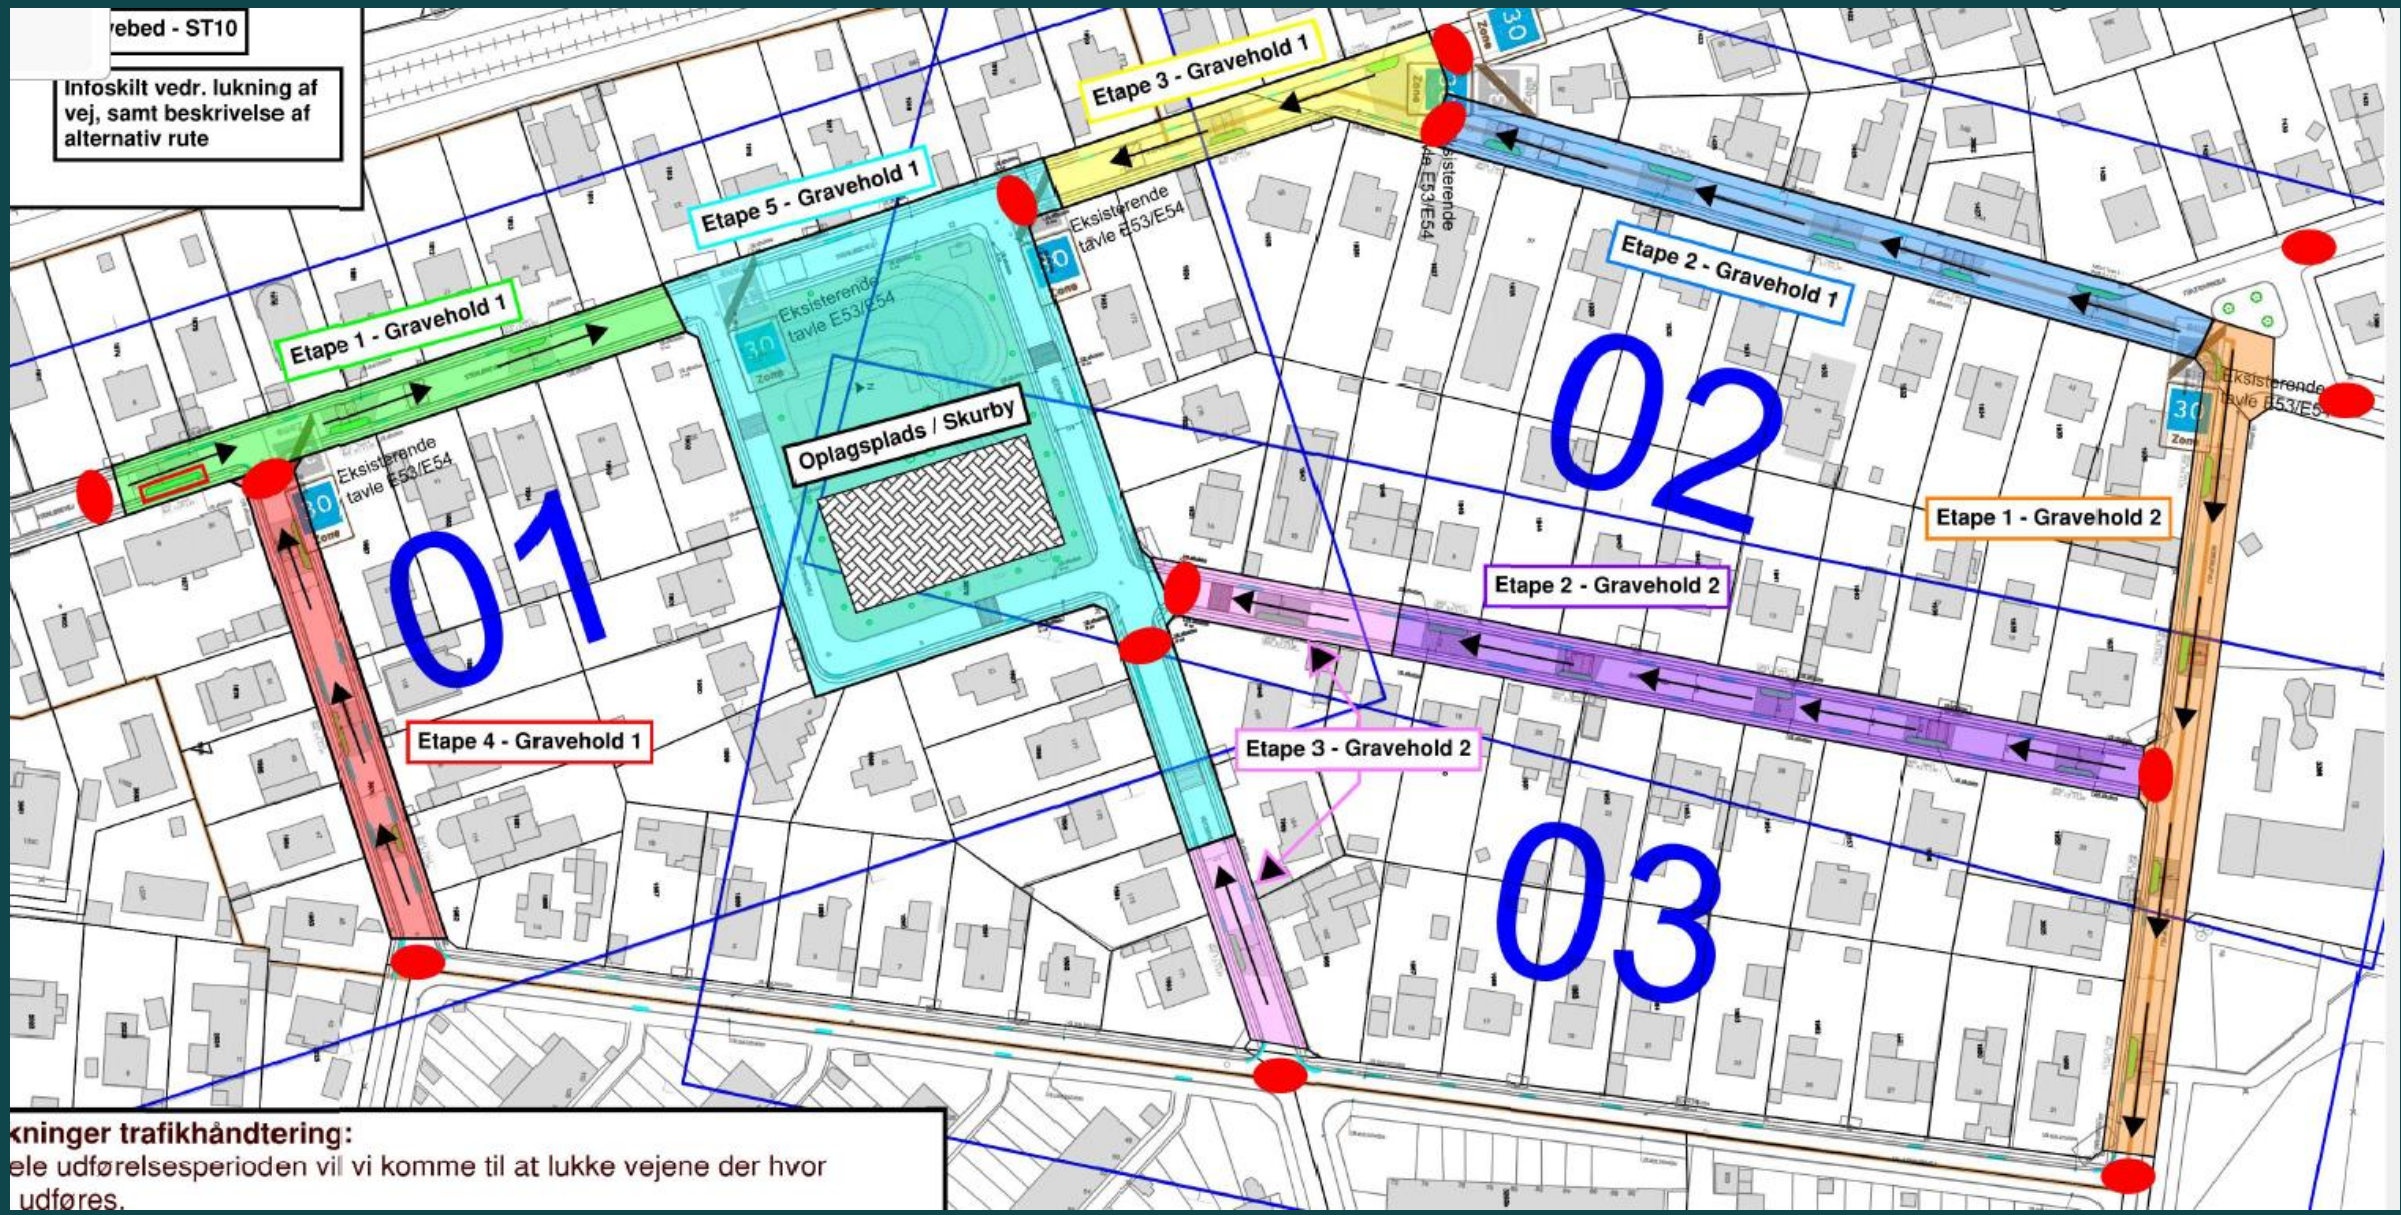

Lukning af veje

- Tidsplan sammen med projektplan giver jer overblikket – fremsendes efterfølgende
- **Kontrakt** – Der vil altid være en informationstavle på skurvogn
- **Kontrakt** - Brevomdeling – 14 dage før arbejdet opstartes
- **Kontrakt** - Skilteplan – skilte opsættes tre arbejdsdage før arbejdet opstartes.
- **Kontrakt** - Åben skurvogn en gang om ugen
- **Kontrakt** – maksimalt 5 bede under etablering på maksimalt to veje af gangen (trafikalt, hensigtsmæssigt og sikkerhed)
- Entreprenør er valgt ud fra deres dels deres kommunikationsplan og engagement i at inddrage jer.
- Jeg vil være at finde i skurvognen hver dag eller hver anden.



HOFOR

Støj-, lugt- og luftgener

- Arbejdstiden for anlægsarbejdet vil som udgangspunkt være fra kl. 07.00 til 17.00.
- Der planlægges ikke arbejde i weekenderne.
- Som tidsplanen afspejler, har vi stort fokus på at minimere generne for jer. Derfor udfører vi eksempelvis ikke støjende arbejder i ferieperioder, hvor aktiviteterne primært vil bestå af oprydning og klargøring.
- Tøv ikke med at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller bekymringer. I er altid velkomne i skurvognen eller kan blot banke på.

Jeg er meget stolt af at kunne fortælle, at:
Hele projektet vil blive udført med emissionsfrie maskiner.
Fordelene er blandt andet:

- Mindre støj
- Mindre luftforurening
- Et bedre arbejdsmiljø for både medarbejdere og omgivelser



HOFOR

Kommunikationsplan

- En liste over projektets nøglepersoner vil blive delt med alle relevante kontaktpersoner.
- Skurvognen er altid åben, og I skal ikke tøve med at banke på og tage en snak med os.
- **Åben skurvogn:** Der vil altid være en repræsentant til stede, som kan besvare spørgsmål.
- Der afholdes statusmøder hver uge eller hver anden uge med Malthe og øvrige nøglepersoner.
- Københavns Kommune er trafikmyndighed og vil løbende blive orienteret om projektets fremdrift.
- Det er jer, der er de vigtigste interessenter i dette projekt, og jeg håber, at jeg har formået at vise jer netop det.

HOFOR



SPØRGSMÅL?

HOFOR
